

Первое Заседание Руководящего Комитета Проекта

4 апреля 2023 года

Отель Шератон Астана, Казахстан

Руководящий Комитет Проекта (РКП)

Задача РКП:

Контроль и утверждение общего направления проекта

На повестке дня:

- Прогресс, достигнутый за последние 6 месяцев (15 сентября 2022 – 14 марта 2023)
- Мероприятия, запланированные на следующие 6 месяцев (15 марта 2023 – 14 сентября 2023)

Содержание



- 1 Общая информация о проекте SECCA
- 2 Основные вехи реализации проекта
- 3 Вовлечение заинтересованных сторон
- 4 План работы и Подход
- 5 Цель и результаты проекта
- 6 Достигнутый прогресс и запланированные мероприятия по
Результатам (Outputs) и Видам деятельности (Activities)

Общая информация о проекте SECCA (1)

Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA):

Финансируемый ЕС проект регионального сотрудничества между Европейским Союзом и странами-партнерами в Центральной Азии в области устойчивой энергетики

Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан



Общая информация о проекте SECCA (2)

- **Заказчик:** Представительство ЕС в Казахстане
- **Сумма контракта:** 6 800 400 евро
- **Продолжительность:** 48 месяцев, начиная с 15 марта 2022 года
- **Реализуется:**
 - Консорциумом STANTEC sa/nv совместно с
 - Intec-GOPA (Международные консультанты по энергетике)
 - ACTED
 - Флорентийская школа регулирования (FSR) - Энергетика

Основные вехи реализации проекта

- **15 марта 2022 г.** - **Дата начала проекта**
- 29 марта 2022 г. - Стартовое заседание (г. Астана, Казахстан)
- **25 октября 2022 г.** - **Утверждение Начального Отчета Проекта**
- 17 ноября 2022 г. - Запуск проекта (г. Самарканд, Узбекистан)
- **14 марта 2023 г.** - **Дата окончания 1^{го} года**
- 4 апреля 2023 г. - I заседание Руководящего Комитета Проекта (РКП)



ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



Funded by
the European Union

Вовлечение заинтересованных сторон (1)

Назначение “Государственных партнеров” странами-бенефициарами

- Казахстан - Министерство энергетики
- Кыргызстан - Министерство энергетики
- Таджикистан - Министерство энергетики и водных ресурсов
- Туркменистан - ожидается : Министерство энергетики
- Узбекистан - Агентство стратегических реформ

Вовлечение заинтересованных сторон (2)

Установление эффективного сотрудничества с Представительствами ЕС в странах-бенефициарах

- Казахстан - г-н Йоханнес Баур, г-н Роберт Брудзинский
- Кыргызстан - г-н Бакыт Айтуганов
- Таджикистан - г-н Марк Бухманн, г-н Уильям Линдберг
- Туркменистан - г-жа Рената Вробель, г-жа Катарина Клейношег
- Узбекистан - г-н Александр Зенебе

Вовлечение заинтересованных сторон (3)

Для постоянного присутствия и надлежащей координации деятельности в странах-бенефициарах

- **Создание сети национальных координаторов Неключевых Экспертов (НКЕ)**

- Казахстан - Заключен контракт, работает
- Кыргызстан - Заключен контракт, работает
- Таджикистан - Предварительно отобран
- Туркменистан - Предварительно отобран
- Узбекистан - В процессе оценки кандидатов

Вовлечение заинтересованных сторон (4)

Для постоянного диалога и надлежащего планирования в реализации мероприятий в странах-бенефициарах

- **Миссии в страны** - консультации с заинтересованными сторонами, обсуждение объема запланированных работ (ОР) ТП, планирование и организация мероприятий
 - Казахстан - Команда SECCA базируется в Астане, Казахстан
 - Кыргызстан - 16-29 октября 2022 г.; 25 февраля - 2 марта 2023 г.
 - Таджикистан - 7-10 марта 2023 г.
 - Туркменистан - 21-25 ноября 2022 г.; 12-18 марта 2023 г.
 - Узбекистан - 7-18 ноября 2022 г.; 21-24 февраля 2023 г.



ПЛАН РАБОТЫ И ПОДХОД

ПЛАН РАБОТЫ БЫЛ РАЗРАБОТАН В РАМКАХ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРОЕКТА, С АКЦЕНТОМ НА I ГОД ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА




Funded by
the European Union

План работы и Подход (1)

Региональный и страновой в следующих областях:

- Энергетические связи
- Разработка стратегии устойчивой энергетики
- Возобновляемая энергия
- Энергетическая эффективность
- Энергетические данные и статистика
- Энергетическое моделирование
- Финансирование устойчивой энергетики
- Гендерное равенство

Деятельность осуществляется **по запросу стран бенефициаров**

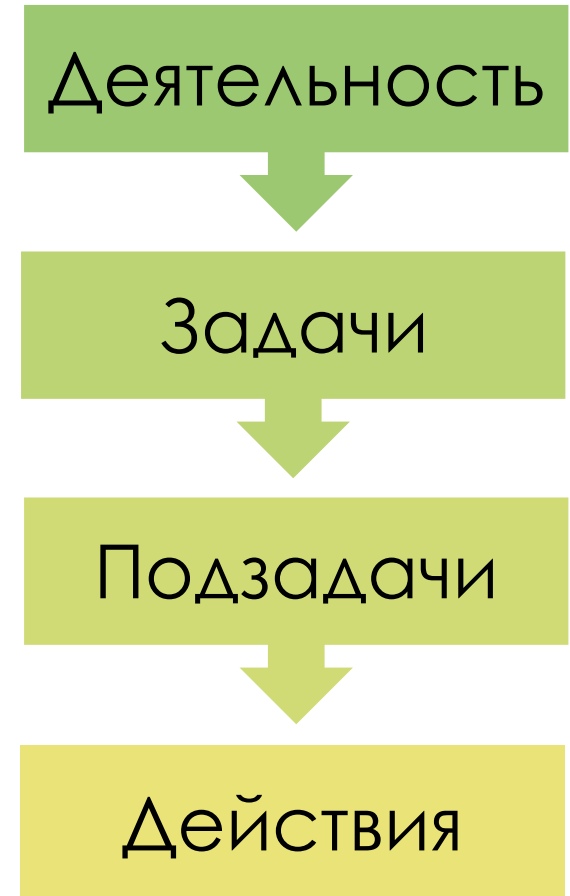

План работы и Подход (2)




- **Для каждой деятельности**, определены конкретные результаты
- **Для каждого кластера** деятельности включают элементы Плана действий по **коммуникации и популяризации**



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА


Цель и результаты проекта (1)



Общая цель:

Способствовать формированию более устойчивого энергетического баланса в Центральноазиатском регионе в соответствии с передовой практикой ЕС

Цели и результаты проекта (2)

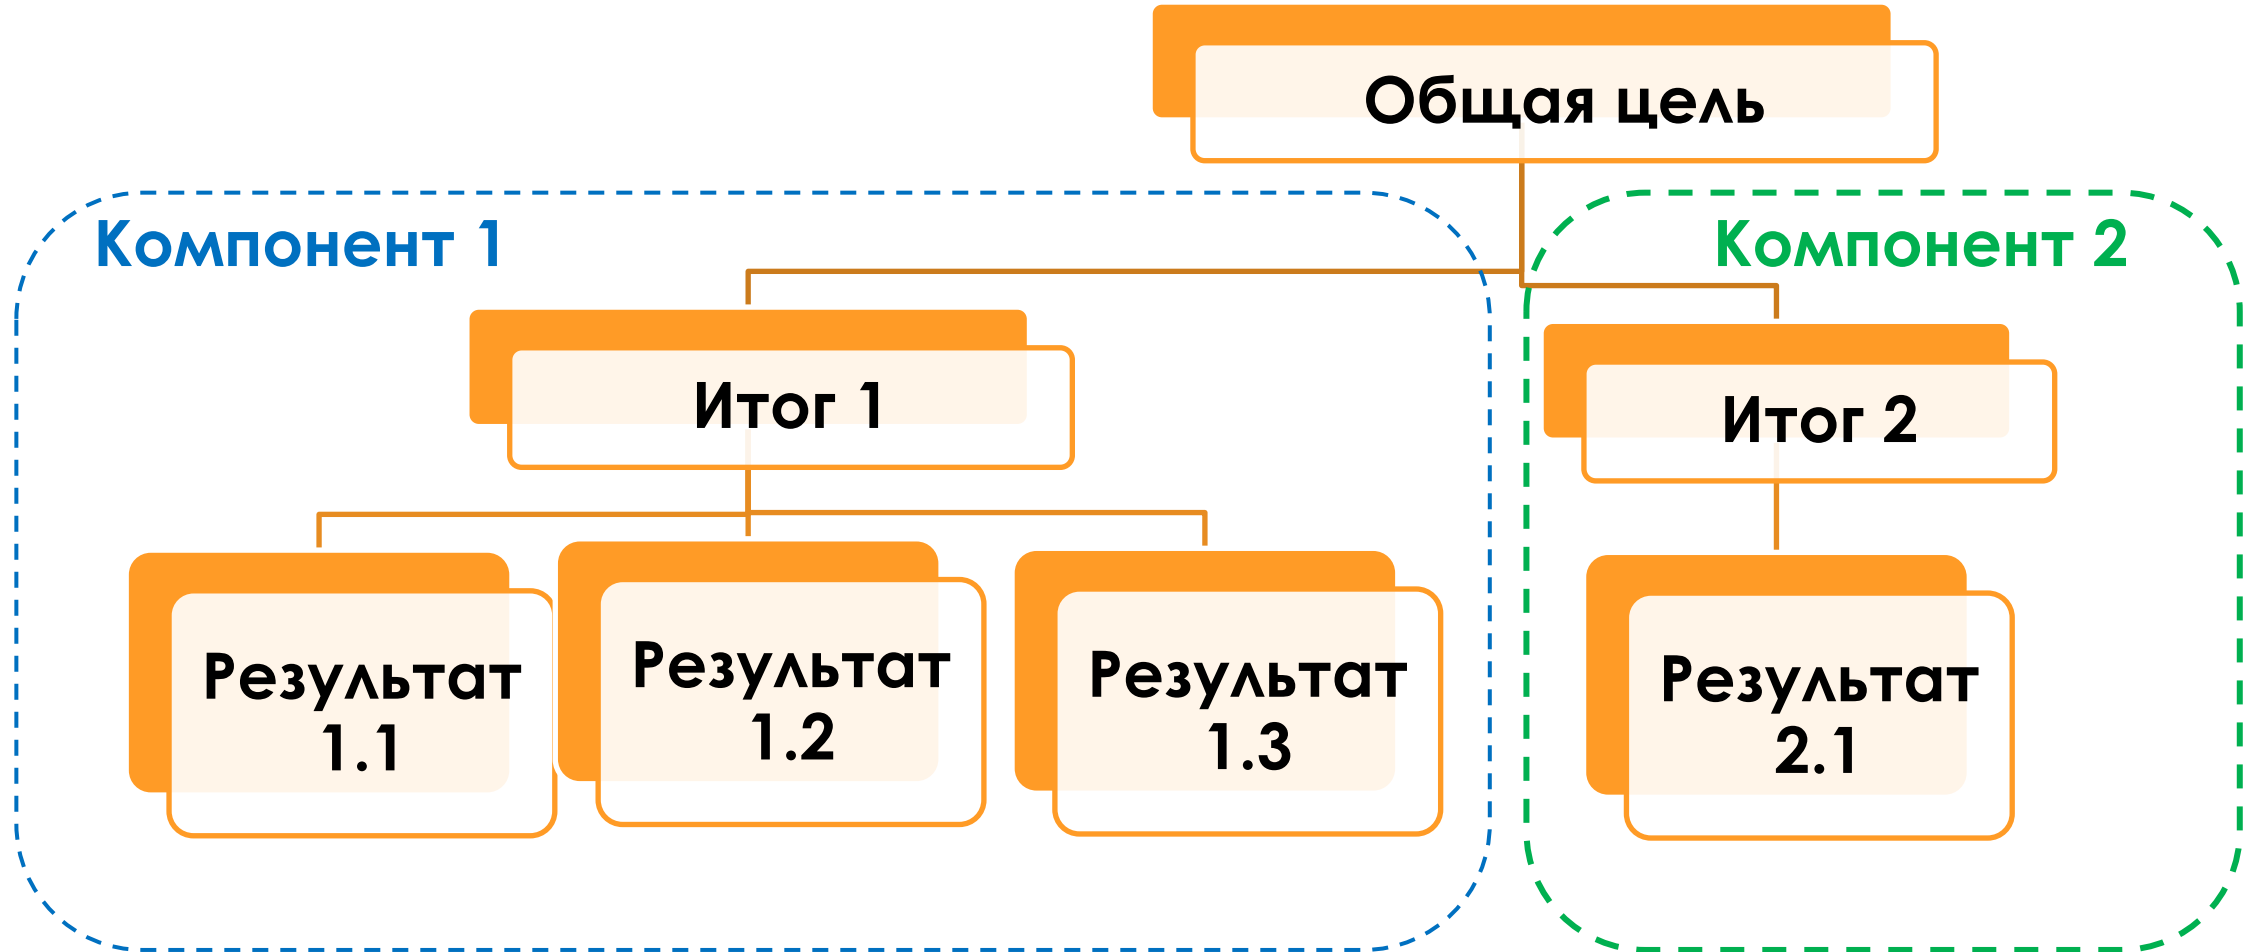

Ожидаемые результаты: Компонент 1

КОМПОНЕНТ 1:

Формирование политической, нормативной и организационной базы для перехода каждой из стран Центральной Азии к устойчивой энергетической системе

Итог 1: Усовершенствованная и комплексная политическая, нормативная и институциональная база для перехода к устойчивой энергетической системе в региональном контексте

Результат 1.1: Укрепление общественного потенциала для управления, разработки стратегии, разработки гендерно-инклюзивной политики и нормативно-правовой базы для внедрения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

Результат 1.2: Повышение осведомленности общественности о важности ЭЭ и ВИЭ и соответствующих технологиях

Результат 1.3: Укрепление потенциала для управления данными, информацией и моделированием в области энергетики

Ожидаемые результаты: Компонент 2

КОМПОНЕНТ 2:

Продвижение и стимулирование инвестиций, укрепление потенциала и повышение осведомленности в области устойчивой энергетики в ЦА

Итог 2: Увеличение объема инвестиций, укрепленный потенциал и высокая осведомленность в области устойчивой энергетики в регионе ЦА

Результат 2.1: Совершенствование процесса определения и повышение доступности инвестиционных проектов в области ЭЭ и ВИЭ, а также наиболее подходящих технологий и инновационных механизмов финансирования с учетом равных возможностей, справедливого и эффективного участия женщин



ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД



Funded by
the European Union

Достигнутый и запланированный прогресс – по Результатам Результат 1.1 (1)

| Деятельность | До 14 Мар 2023 | След. 6 мес. |
|--|----------------|--------------|
| 1.1.1. Оказание помощи в разработке региональных и страновых рамок для гендерной и климатически чувствительной политики в области ЭЭ и ВИЭ | Realized | Realized |
| 1.1.2. Поддержка в разработке и создании Центра Устойчивой Энергетики ЕС-Центральная Азия (CARSEC) | Not started | Not started |
| 1.1.3. Вовлечение представителей стран ЦА в периодический политический диалог и технические встречи на высоком уровне ЕС | Realized | Realized |
| 1.1.4. Помощь в разработке и внедрении национальных планов действий по ВИЭ (NREAP) и ЭЭ (NEEAP) для конкретных стран | Realized | Realized |
| 1.1.5. Предоставление ТП странам, связанной с разработкой, гармонизацией и внедрением (а) миним. стандартов по ЭЭ (MEPS) зданий и (б) энергетической маркировки электрических приборов | Not started | Planned |



Не начато



Планируется



Реализуется

Достигнутый и запланированный прогресс – по Результатам Результат 1.1 (2)

| Деятельность | До 14 Мар 2023 | След. 6 мес. |
|--|----------------|--------------|
| 1.1.6. ТП в области энергоаудита для устойчивых/ климатостойчивых зданий и промышленности | [Blue] | [Yellow] |
| 1.1.7. Нарращивание потенциала для ЭЭ/ВИЭ | [Green] | [Green] |
| 1.1.8. Проведение тренингов для соответствующих учреждений по разработке, планированию и реализации проектов в рамках программы Horizon Europe | [Blue] | [Blue] |
| 1.1.9. Организация Дней Устойчивой Энергетики в странах ЦА | [Green] | [Green] |
| 1.1.10. Повышение осведомленности о преимуществах перехода к более устойчивым и гендерно-инклюзивным энергосистемам | [Blue] | [Yellow] |
| 1.1.11. Оказание помощи странам ЦА в использовании возможностей, предоставляемых Парижским Соглашением | [Blue] | [Blue] |



Не начато



Планируется



Реализуется

Достигнутый и запланированный прогресс – по Результатам Результат 1.2

| Деятельность | До 14 Мар 2023 | След. 6 мес. |
|--|-------------------|-----------------|
| 1.2.1. Расширение доступа университетов ЦА к знаниям в области ЭЭ | | |
| 1.2.2. Разработка плана информационно-разъяснительной работы для политиков по региональному и страновому энергетическому моделированию | | |
| 1.2.3. Дальнейшее продвижение ЭЭ и ВИЭ для целевых групп посредством производства и публикации в интернете коротких видеороликов и отчетов о передовом опыте | | |



Не начато



Планируется



Реализуется

Достигнутый и запланированный прогресс – по Результатам Результат 1.3

| Деятельность | До 14 Мар 2023 | След. 6 мес. |
|---|----------------|--------------|
| 1.3.1. Предоставление ТП в улучшении региональных и национальных статистических данных и информации | ■ | ■ |
| 1.3.2. Содействие обмену информацией между странами ЦА | ■ | ■ |
| 1.3.3. Повышение точности отчетности по ЦУР 7 при разработке политики по устойчивой энергетике | ■ | ■ |
| 1.3.4. Разработка всеобъемлющих баз данных национальных энергетических систем | ■ | ■ |
| 1.3.5. Оказание ТП в разработке Региональной Энергетической Модели Центральной Азии | ■ | ■ |
| 1.3.6. Оценка осуществимости строительства вставки высоковольтного постоянного тока (back-to-back HVDC) между странами ЦА | ■ | ■ |



Не начато



Планируется



Реализуется

Достигнутый и запланированный прогресс – по Результатам Результат 2.1

| Деятельность | До 14 Мар 2023 | След. 6 мес. |
|---|----------------|--------------|
| 2.1.1. Оказание ТП странам для разработки пилотных инвестиционных проектов в области ЭЭ и ВИЭ для расширения региональных связей | | |
| 2.1.2. Обеспечение ТП странам ЦА для разработки инвестиционных проектов в области ЭЭ и ВИЭ для расширения региональных связей | | |
| 2.1.3. Установка и координация региональных и национальных контактов и обмена между заинтересованными сторонами в области ВИЭ и ЭЭ в регионе и в ЕС для тиражирования пилотных проектов | | |
| 2.1.4. Поддержка сбора и распространения информации для использования в рамках политики по гендерному равенству среди разных целевых групп | | |
| 2.1.5. Организация совещаний с заинтересованными сторонами и МФИ по выявлению/разработке инвестиционных проектов по ВИЭ/ЭЭ приемлимых для финансирования | | |
| 2.1.6. Оказание специальной технической помощи для Евроделегации | | |



Не начато



Планируется



Реализуется

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (1)

1.1.1. Оказание помощи в разработке региональных и страновых рамок политики по ЭЭ и ВИЭ с учетом гендерных и климатических факторов

| Рег | | |
|------|--|---|
| Каз | <ul style="list-style-type: none"> Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none"> Отчет о существующих схемах поддержки |
| Кырг | <ul style="list-style-type: none"> Проект Оценочного отчета (статус развития малой гидроэнергетики и выработка рекомендаций) | <ul style="list-style-type: none"> Подготовка Оценочного отчета завершена Изучен потенциал использования биомассы для производства энергии Отчет о существующих схемах поддержки |
| Тадж | <ul style="list-style-type: none"> Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none"> В соответствии с полученными запросами |
| Турк | <ul style="list-style-type: none"> Участие и выступление на Конференции "Зеленая энергетика и стратегии ЕС в области использования водорода и сокращения выбросов метана", 22-23 ноября 2022 года | <ul style="list-style-type: none"> В соответствии с полученными запросами |
| Узб | <ul style="list-style-type: none"> Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none"> Отчет о существующих схемах поддержки |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (2)

1.1.3. Участие представителей стран Центральной Азии в периодическом политическом диалоге высокого уровня и технических совещаниях с ЕС

| | | |
|-------------|---|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">• Круглый стол по запуску проекта SECCA | |
| Каз | <ul style="list-style-type: none">• Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">• Отчет о существующих схемах поддержки |
| Кырг | <ul style="list-style-type: none">• Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">• Отчет о существующих схемах поддержки |
| Тадж | <ul style="list-style-type: none">• Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">• Отчет о существующих схемах поддержки |
| Турк | <ul style="list-style-type: none">• Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">• Отчет о существующих схемах поддержки |
| Узб | <ul style="list-style-type: none">• Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">• Отчет о существующих схемах поддержки |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (3)

1.1.4. Помощь в разработке и внедрении национальных планов действий по ВИЭ (NREAP) и ЭЭ (NEEAP) для конкретных стран

| | | |
|-------------|---|--|
| Каз | <ul style="list-style-type: none">Разработка проекта Концепции ЭЭ | <ul style="list-style-type: none">Завершение разработки концепции ЭЭПроведение конференции устойчивой энергетики в рамках ДУЭ |
| Кырг | <ul style="list-style-type: none">Начался процесс создания Межведомственной рабочей группы (МВРГ)Круглый стол с будущими членами МВРГ (26.10.2022; 01.03.2023) | <ul style="list-style-type: none">МВРГ создана и полностью функционируетПроведение конференции устойчивой энергетики в рамках ДУЭ |
| Тадж | <ul style="list-style-type: none">Подход к стратегическому планированию устойчивой энергетики обсуждался с Представительством ЕС в Таджикистане и с ключевыми заинтересованными сторонами | <ul style="list-style-type: none">Заключен контракт с НКЕ для стратегического планирования устойчивой энергетикиПроведение конференции устойчивой энергетики в рамках ДУЭ |
| Турк | <ul style="list-style-type: none">Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">Планируется проведение конференции устойчивой энергетики в рамках ДУЭ |
| Узб | <ul style="list-style-type: none">Нет полученных запросов | <ul style="list-style-type: none">Проведение конференции устойчивой энергетики в рамках ДУЭ |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (4)

1.1.5. Предоставление ТП странам, связанной с разработкой, гармонизацией и внедрением (а) минимальных стандартов по ЭЭ (MEPS) зданий и (б) энергетической маркировки электрических приборов

| Рег | | |
|------|-----------------|---|
| Каз | • Еще не начато | Для миним. стандартов по ЭЭ (MEPS) : <ul style="list-style-type: none">• Составлен ТЗ и заключены контракты с NKE• Разработана первоначальная оценка текущего состояния MEPS для зданий Для энергетической маркировки электрических приборов <ul style="list-style-type: none">• Составлен ТЗ и заключены контракты с NKE• Разработана первоначальная оценка текущего состояния системы энергетической маркировки• Будет запланирован региональный семинар - для представления передового опыта ЕС в области энергетической маркировки и эко-дизайна |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (5)

1.1.6. ТП в области энергоаудита для устойчивых/климатоустойчивых зданий и промышленности

| Рег | | |
|------|-----------------|---|
| Каз | • Еще не начато | Для проведения энергетических аудитов в зданиях Для всех стран: <ul style="list-style-type: none">• Составлен ТЗ и заключены контракты с NKE• Проведена первоначальная оценка текущего состояния практики энергоаудита в зданиях• Запланирован семинар по внедрению передового опыта ЕС в области энергоаудита зданий Для проведения энергоаудитов в промышленности Для Казахстана и Узбекистана: <ul style="list-style-type: none">• Составлены ТЗ и заключены контракты с NKE• Проведена первоначальная оценка текущего состояния практики энергоаудита в промышленности• Запланирован семинар по внедрению передового опыта ЕС в области энергоаудита в промышленности |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (6)

1.1.7. Нарращивание потенциала для ЭЭ/ВИЭ

| | | |
|-------------|--|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">Участие и выступление на Конференции "Зеленая энергетика и стратегии ЕС в области использования водорода и сокращения выбросов метана", 22-23 ноября 2022 года | <ul style="list-style-type: none">Региональный тренинг по возможностям зеленого финансирования запланирован на 6-8 июня в Ташкенте, УзбекистанБудет разработана Концепция по 1-му учебному визиту по разработке и реализации политики в области ЭЭ и ВИЭ в выбранной стране Евросоюза и/или Договаривающихся Сторонах Энергетического Сообщества (ДС ЭС) |
| Каз | <ul style="list-style-type: none">Еще не начато | <ul style="list-style-type: none">Составлены ТЗ и заключены контракты с НКЕНачата оценка потребностей в обучении по конкретным странам |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (7)

1.1.9. Организация Дней устойчивой энергетики стран ЕС и ЦА

| | | |
|-------------|--|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none"> Региональный конкурс роликов #4sustainable energy, включены в программу ДУЭ ЦА Разработаны условия конкурса роликов, для студентов университетов ЦА, молодых исследователей и молодых специалистов в области энергетики | <ul style="list-style-type: none"> Объявлен конкурс роликов #4sustainable energy (30 марта 2023 года) Победители будут объявлены на конференции по устойчивой энергетике в Казахстане (2 июня 2023 года) Для победителей планируется учебная поездка |
| Каз | <ul style="list-style-type: none"> Даты согласованы | <ul style="list-style-type: none"> ДУЭ планируется (1-2 июня 2023 года) |
| Кырг | <ul style="list-style-type: none"> Проект концептуального документа подготовлен | <ul style="list-style-type: none"> ДУЭ планируется (15-16 мая 2023 года) |
| Узб | <ul style="list-style-type: none"> Проект программы Конференции по устойчивой энергетике подготовлен | <ul style="list-style-type: none"> ДУЭ планируется (20-21 июня 2023 года) |
| Тадж | <ul style="list-style-type: none"> Еще не начато | <ul style="list-style-type: none"> Даты согласованы Проект концепции подготовлен |
| Турк | <ul style="list-style-type: none"> Еще не начато | <ul style="list-style-type: none"> Проект программы Конференции по устойчивой энергетике подготовлен |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (8)

1.1.10. Повышение осведомленности в конкретных странах и регионах о преимуществах перехода к более устойчивым и гендерно-инклюзивным энергетическим системам

| | | |
|-------------|---|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">Разработана Стратегия коммуникации и наглядности и соответствующий План действий по коммуникации и наглядности8 журналистов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, победители региональных конкурсов СМИ посетили Нидерланды для недельной ознакомительной поездки на тему "Возобновляемые источники энергии - современное состояние» который был организован проектом WECOOP и софинансирован проектом SECCA | <ul style="list-style-type: none">По мере прогресса проекта |
| Каз | <ul style="list-style-type: none">Еще не начато | <ul style="list-style-type: none">Еще не планируется |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (9)

1.2.1. Расширение доступа университетов ЦА к знаниям в области ЭЭ

| | | |
|------|---|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">Условия проведения роликов #4sustainable energy, разработаны для студентов университетов ЦА, молодых исследователей и молодых специалистов в области энергетики | <ul style="list-style-type: none">Объявлен конкурс роликов #4sustainable energy (30 марта 2023 года)Победители будут объявлены на конференции по устойчивой энергетике в Казахстане (2 июня 2023 года)Для победителей планируется учебная поездка |
| Каз | <ul style="list-style-type: none">Еще не начато | <ul style="list-style-type: none">Еще не планируется |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (10)

1.2.2. Разработка плана информационно-разъяснительной работы для политиков по региональному и страновому энергетическому моделированию

| | | |
|------|---|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">• Еще не начато | <ul style="list-style-type: none">• Разработан первоначальный план информационно-разъяснительной работы |
| Каз | | |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (11)

1.2.3. Продвижение ЭЭ и ВИЭ для дальнейших целевых групп посредством производства и публикации в интернете коротких видеороликов и отчетов о передовом опыте

| | | |
|------|---|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">• Еще не начато | <ul style="list-style-type: none">• Разработка Концепции на региональном уровне и для каждой страны |
| Каз | | |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (12)

1.3.1. Предоставление технической помощи для улучшения региональных и национальных статистических данных и информации. Региональные и национальные статистические данные и информация

| | | |
|-------------|--|--|
| Рег | <ul style="list-style-type: none"> Программа регионального семинара по энергетической статистике согласована с национальными агентствами по статистике Разработан проект ТЗ для НКЭ по энергетической статистике | <ul style="list-style-type: none"> С НКЭ заключен контракт Запланирован Региональный тренинг по энергетической статистике, который пройдет 2-5 мая 2023 года в г. Алматы |
| Каз | <ul style="list-style-type: none"> Объем ТП для поддержки Бюро национальной статистики (БНС) согласован Представление обучения на рабочем месте для специалистов БНС запланировано | <ul style="list-style-type: none"> Обучение специалистов БНС без отрыва от работы запланировано на 24-28 апреля 2023 года в г. Астане |
| Кырг | <ul style="list-style-type: none"> Специфика обучения на рабочем месте для специалистов Национального статистического комитета согласована | <ul style="list-style-type: none"> Обучение без отрыва от работы запланировано на 16-17 мая 2023 года. Обучение будут проводить специалисты БНС Казахстана |
| Тадж | <ul style="list-style-type: none"> Еще не начато | <ul style="list-style-type: none"> Не планируется |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (13)

1.3.1. Предоставление технической помощи для улучшения региональных и национальных статистических данных и информации. Совершенствование национальной инвентаризаций зданий

| Рег | | |
|------|---|--|
| Каз | <ul style="list-style-type: none">В рамках Концепции ЭЭ подготовлен обзор опыта ЕС по инвентаризации общественных зданий | <ul style="list-style-type: none">В соответствии с полученными запросами |
| Кырг | <ul style="list-style-type: none">Обсуждена текущая национальная практика сбора данных об энергопотреблении общественных зданий | <ul style="list-style-type: none">Проанализирована национальная практика, а также лучшие практики государств-членов ЕС (ГЧС) и Договаривающихся Сторон Энергетического Сообщества (ДС ЭС) по сбору данных об энергопотреблении бюджетных учрежденийСоставлен ТЗ и заключен контракт с NKEПроведен семинар по ознакомлению с передовой практикой государств-членов ЕС и Договаривающихся сторон Энергетического сообщества в области составления кадастров центральных органов власти/общественных зданий |
| Тадж | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (14)

1.3.5. Предоставление технической помощи для разработки Региональной энергетической модели Центральной Азии

| | | |
|------------|---|--|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">• Заключены контракты с 2 НКЕ по моделированию энергетического сектора и моделированию энергосистем• НКЕ побывали в миссиях и провели первоначальный анализ имеющихся энергетических данных для моделирования в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане• Подготовлен проект отчета• В рамках проекта отчета, НКЕ разработали проект ТЗ для рабочей группы по региональному энергетическому моделированию | <ul style="list-style-type: none">• Завершен отчет (апрель 2023 года)• Разработан проект Дорожной карты (апрель 2023 года)• Доработан и согласован объем работ и ТЗ и для членов рабочей группы (июнь 2023 г.)• Составлены ТЗ для НКЕ (членов региональной рабочей группы по энергетическому моделированию)• Заключены контракты с НКЕ |
|------------|---|--|

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (15)

2.1.4. Поддержка сбора и распространения информации для использования в рамках политики по гендерному равенству среди разных целевых групп

| Рег | | |
|------|---|---|
| Каз | <ul style="list-style-type: none">Еще не начато | <ul style="list-style-type: none">Разработан шаблон отчетов по мониторингу и оценке для конкретных стран, для повышения осведомленности о преимуществах перехода к более устойчивым и учитывающим гендерные аспекты энергетическим системам |
| Кырг | | |
| Тадж | | |
| Турк | | |
| Узб | | |

Достигнутый и запланированный прогресс - по видам деятельности (16)

2.1.5. Организация встреч с заинтересованными сторонами и МФИ по выявлению/разработке приемлемых для финансирования инвестиционных проектов в области ВИЭ и ЭЭ

| | | |
|------------|--|---|
| Рег | <ul style="list-style-type: none">• Во время миссий в страны-бенефициары (февраль-март 2023 года) заинтересованными сторонами был проявлен интерес к изучению возможностей / ограничений в привлечении финансирования через "зеленое" климатическое финансирование (например, через Зеленый климатический фонд; Глобальный экологический фонд).• Обсужден объем работы для NKE в зеленом финансировании | <ul style="list-style-type: none">• Завершена разработка ТЗ для NKE по зеленому финансированию и заключен контракт с NKE• Региональный тренинг по возможностям зеленого финансирования запланирован на 6-8 июня в Ташкенте |
|------------|--|---|
